

CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Area Tecnica — Ufficio Programmazione ed Esecuzione LL.PP.



Sistemazione della pavimentazione stradale in località CRETA

PROGETTO

ESECUTIVO

Tavola n. **16** : Cronoprogramma



IL PROGETTISTA
È

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTI



-- MAG. 2021

Ariano Irpino, li _____

Ariano Irpino

Provincia di Avellino

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Sistemazione della pavimentazione stradale in località CRETA
COMMITTENTE: Comune di ARIANO IRPINO


Ariano Irpino, -/05/2021


IL TECNICO



(Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTTI)



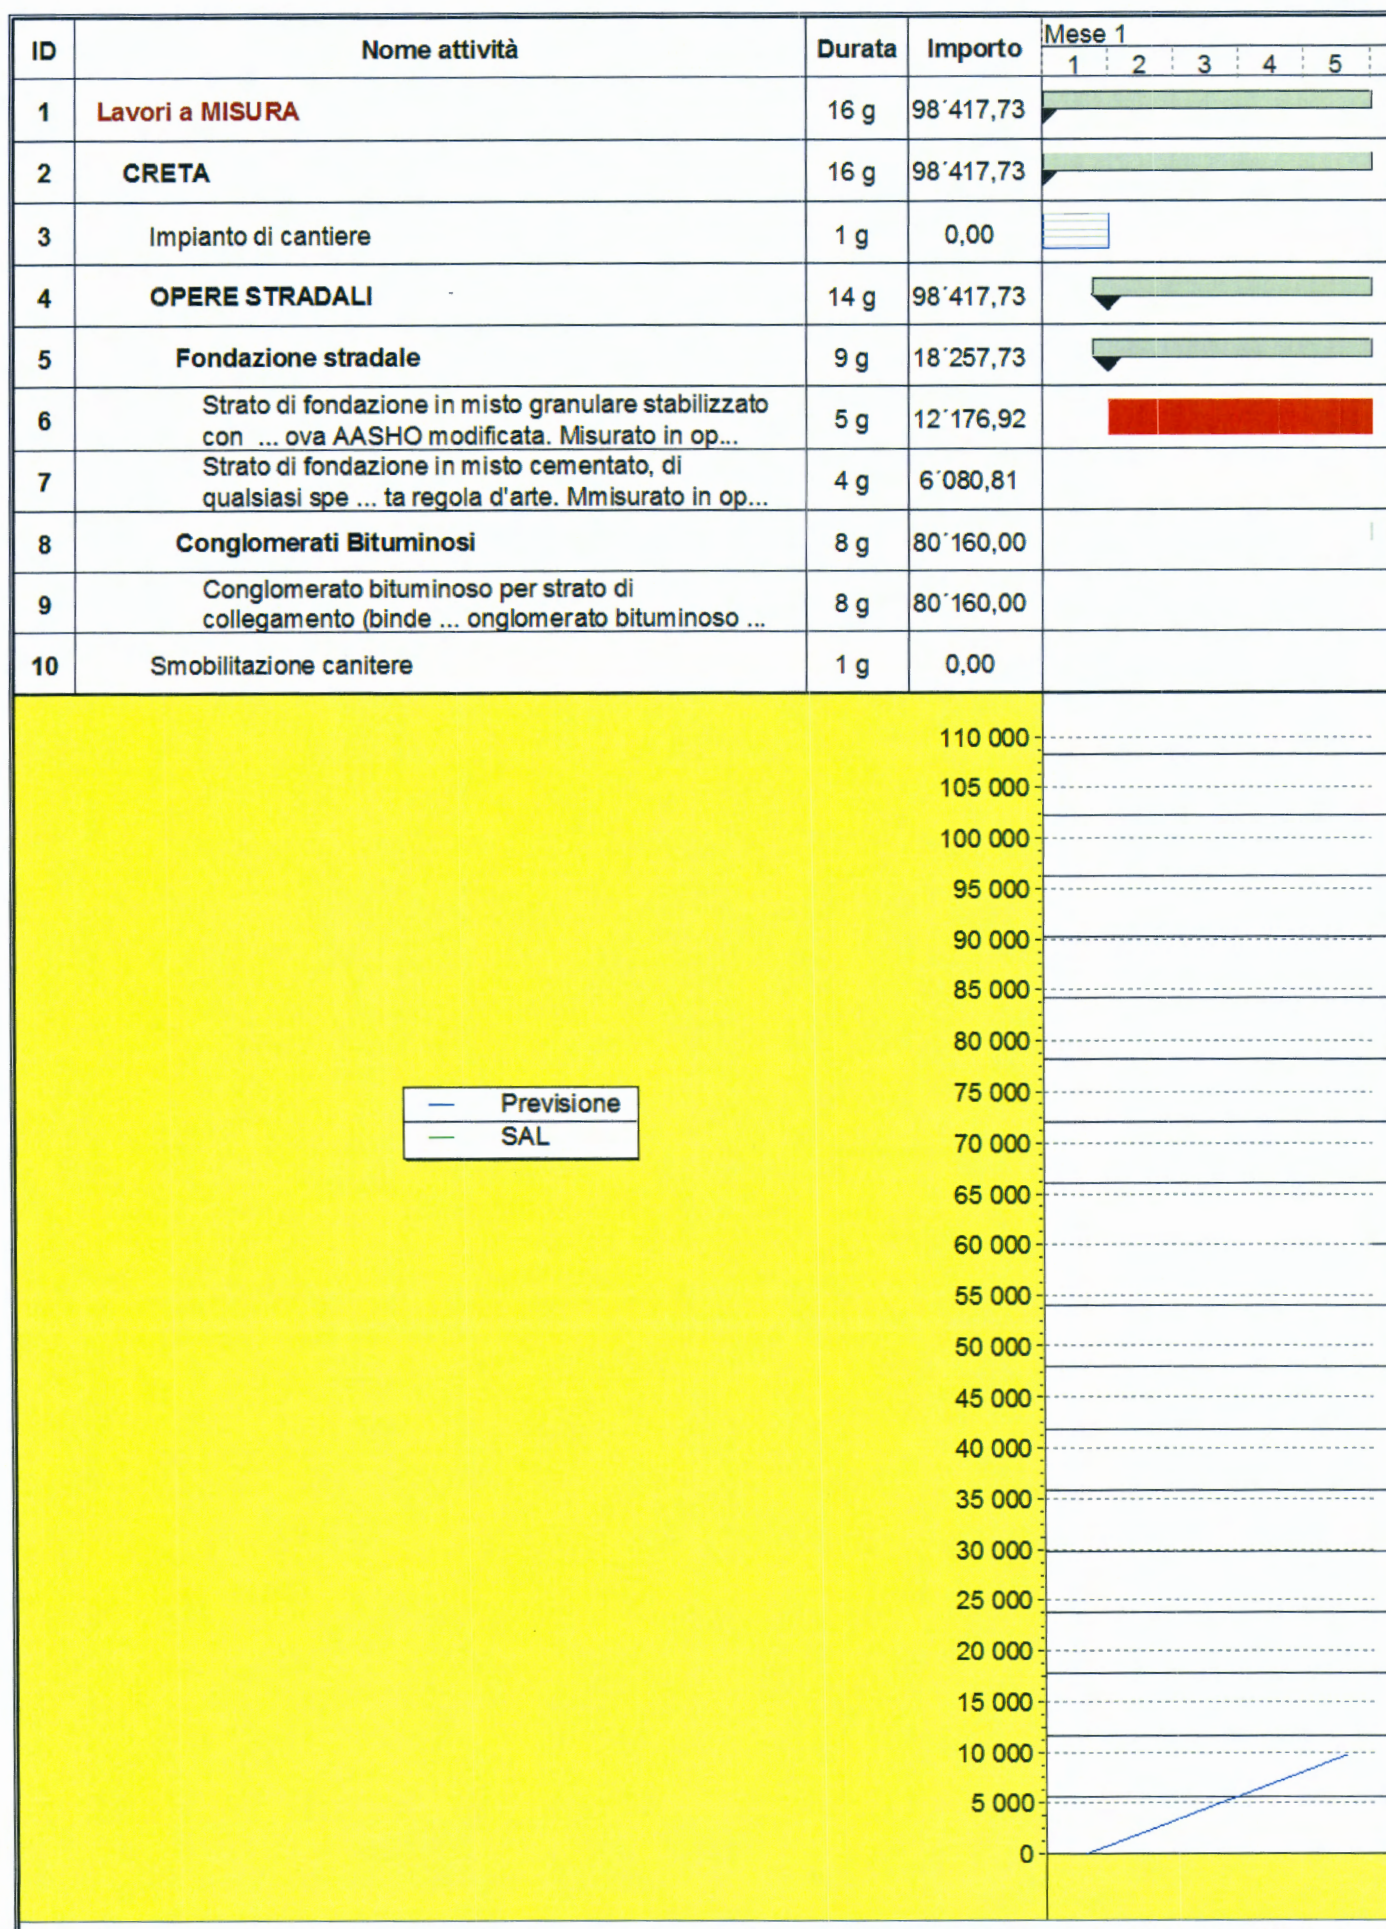

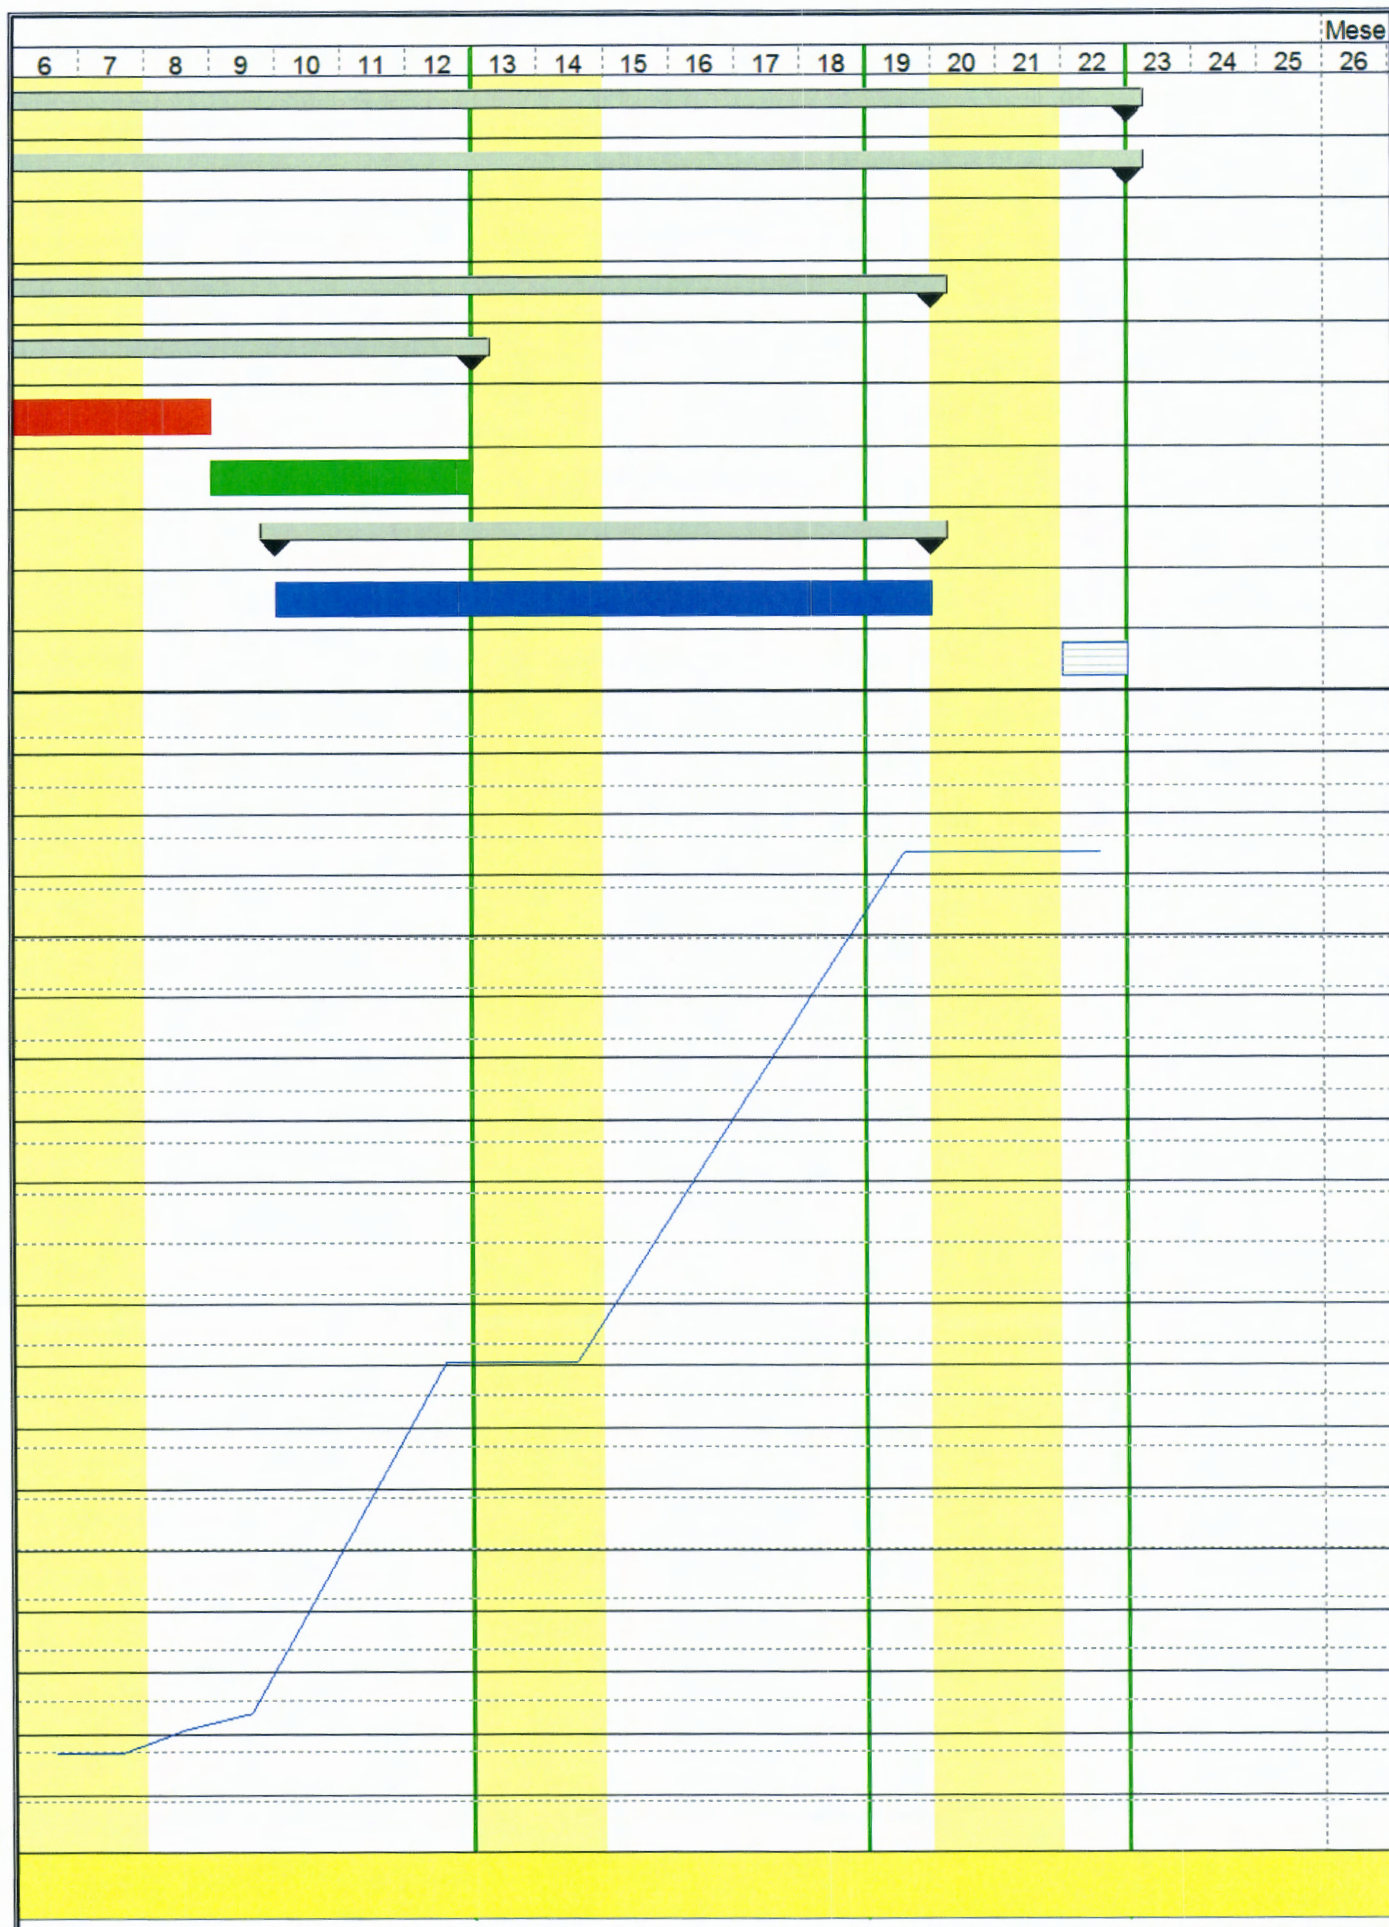

Ariano Irpino

Provincia di Avellino

Tabella Attività

OGGETTO: Sistemazione della pavimentazione stradale in località CRETA

COMMITTENTE: Comune di ARIANO IRPINO

Ariano Irpino, --/05/2021

IL TECNICO



(Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTTI)



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	98'417,73	100,000	1 gg	22 gg	16	22
* CRETA	98'417,73	100,000	1 gg	22 gg	16	22
* * Impianto di cantiere	0,00	0,000	1 gg	1 gg	1	1
* * OPERE STRADALI	98'417,73	100,000	2 gg	19 gg	14	18
* * * Fondazione stradale	18'257,73	18,551	2 gg	12 gg	9	11
* * * * Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... ova AASHO modificata. Misurato in opera dopo costipamento.	12'176,92	12,373	2 gg	8 gg	5	7
* * * * Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ... ta regola d'arte. Mmisurato in opera dopo il costipamento.	6'080,81	6,179	9 gg	12 gg	4	4
* * * Conglomerati Bituminosi	80'160,00	81,449	10 gg	19 gg	8	10
* * * * Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	80'160,00	81,449	10 gg	19 gg	8	10
* * Smobilitazione canitere	0,00	0,000	22 gg	22 gg	1	1

Ariano Irpino, 1--05/2021

Tecnico
Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTTI

COMMITTENTE: Comune di ARIANO IRPINO
TABELLA DELLE ATTIVITA'

Ariano Irpino

Provincia di Avellino


Tabella Date e Importi

OGGETTO: Sistemazione della pavimentazione stradale in località CRETA

COMMITTENTE: Comune di ARIANO IRPINO

Ariano Irpino, --/05/2021

Il Tecnico
(Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTTI)



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	0,00	0,00	0,000
2 gg	2'435,38	2'435,38	2,475
3 gg	2'435,38	4'870,77	4,949
4 gg	2'435,38	7'306,15	7,424
5 gg	2'435,38	9'741,54	9,898
6 gg	0,00	9'741,54	9,898
7 gg	0,00	9'741,54	9,898
8 gg	2'435,38	12'176,92	12,373
9 gg	1'520,20	13'697,12	13,917
10 gg	11'540,20	25'237,32	25,643
11 gg	11'540,20	36'777,53	37,369
12 gg	11'540,20	48'317,73	49,095
13 gg	0,00	48'317,73	49,095
14 gg	0,00	48'317,73	49,095
15 gg	10'020,00	58'337,73	59,276
16 gg	10'020,00	68'357,73	69,457
17 gg	10'020,00	78'377,73	79,638
18 gg	10'020,00	88'397,73	89,819
19 gg	10'020,00	98'417,73	100,000
20 gg	0,00	98'417,73	100,000
21 gg	0,00	98'417,73	100,000
22 gg	0,00	98'417,73	100,000

Ariano Irpino, --/05/2021

Tecnico

Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTTI

